

Plan de Infraestructura



Avances del Plan


OPP

el futuro en
desarrollo

Plan de Infraestructura Original


PERÍODO 2015-2019	Millones USD
Energía	4.230
Vialidad	2.360
Infraestructura Social	1.870
Vivienda	1.320
Comunicaciones	750
Agua y Saneamiento	550
Puertos	550
Ferrovial	360
Otros	380
TOTAL	12.370

Plan de Infraestructura Original

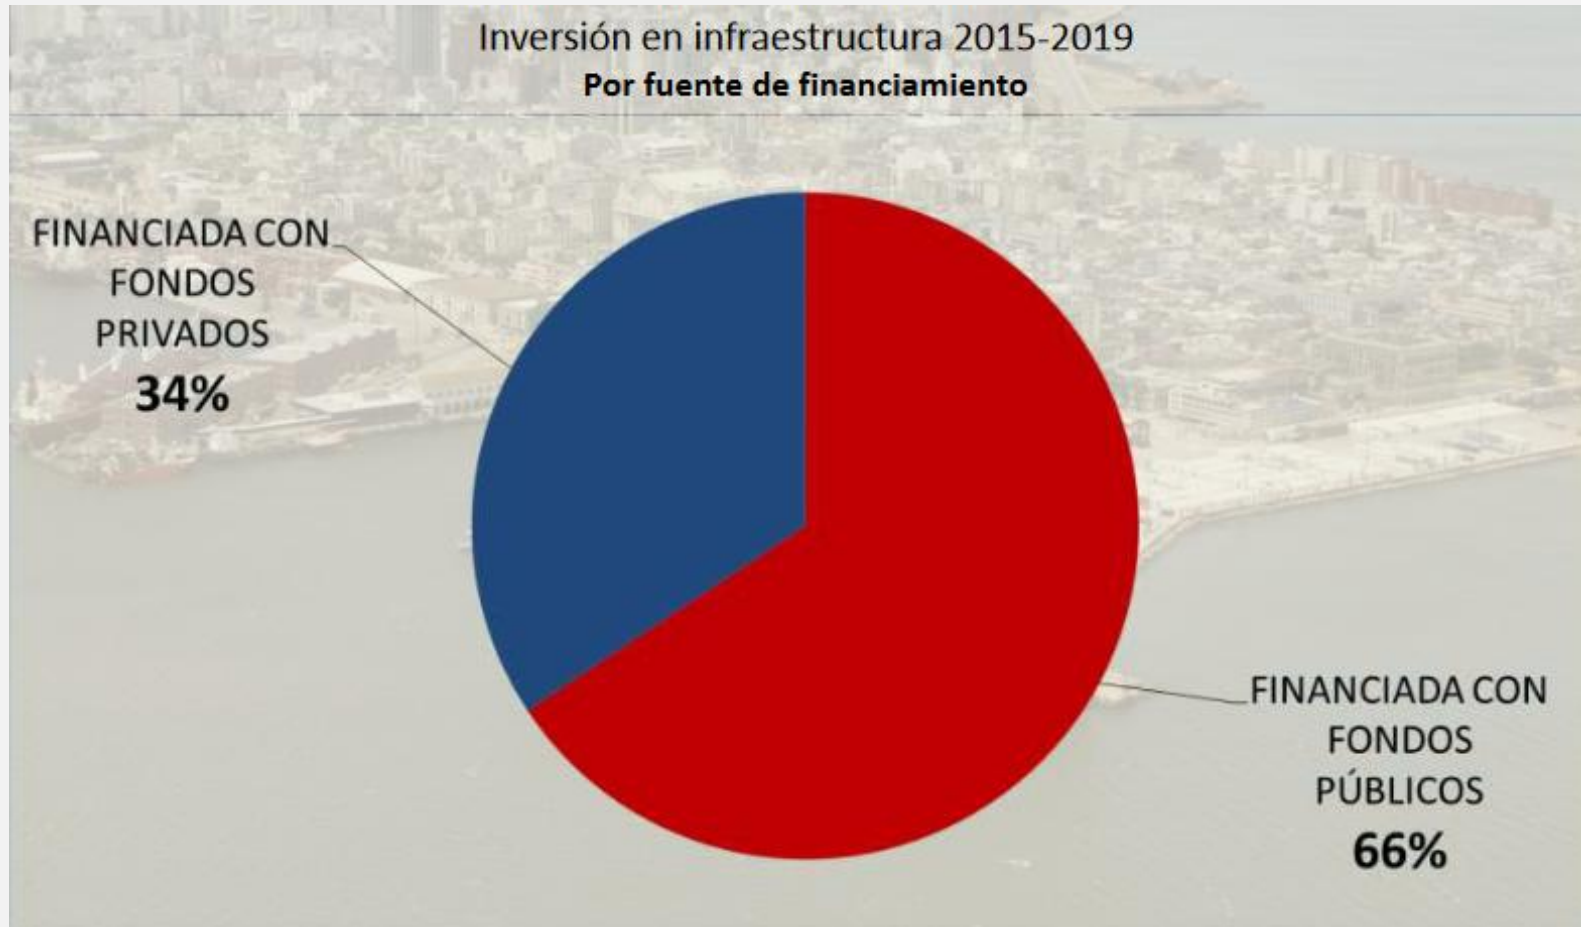

Plan Ajustado


12.370



12.349

OPP

el futuro en
desarrollo

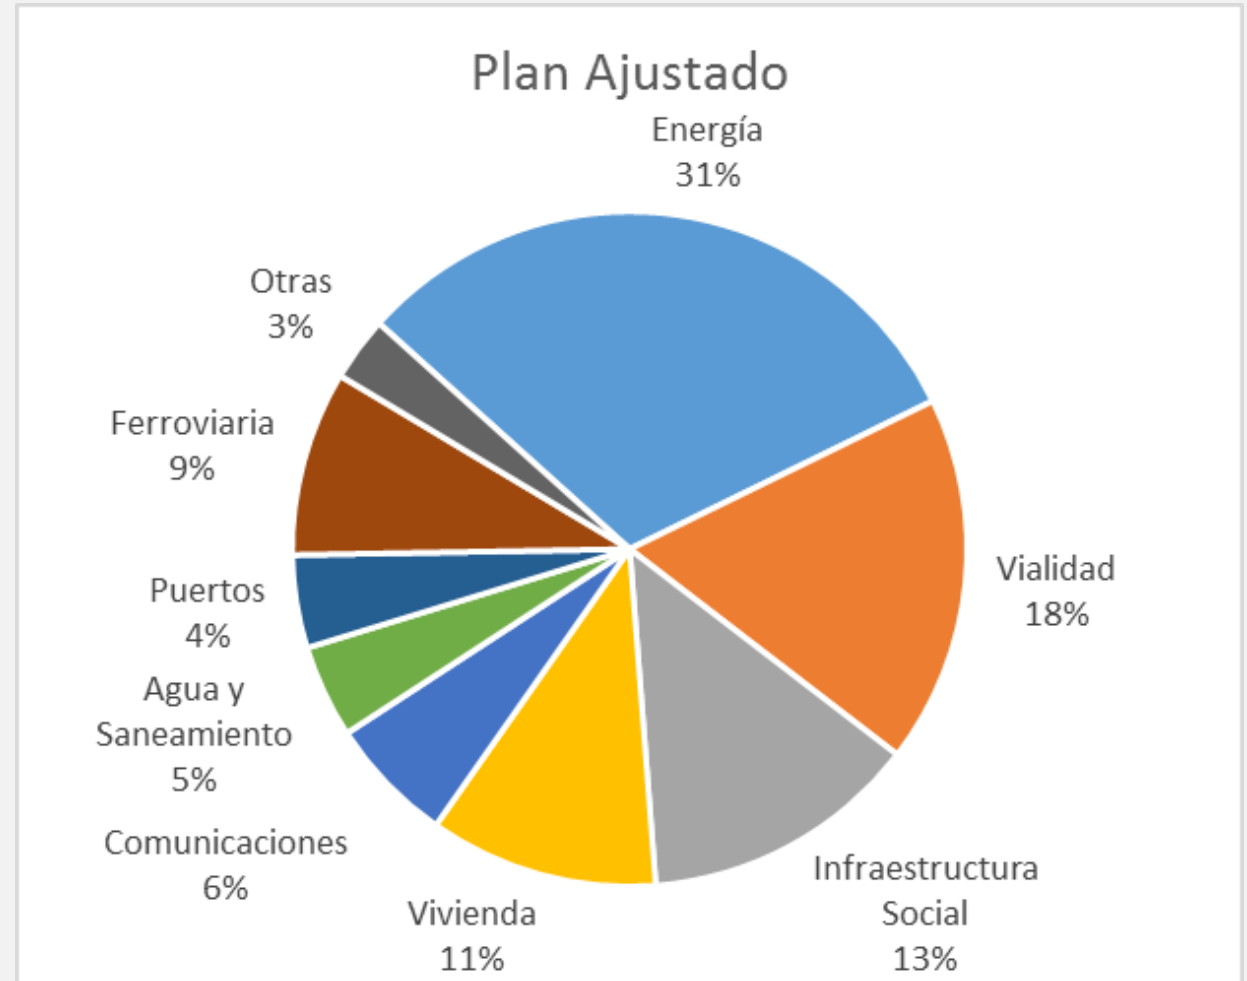

Cartera de proyectos PPP

13 de los 15
proyectos licitados

1 en etapa de
operación

1 en etapa de
construcción

5 en etapa de
cierre financiero


5 en etapa de
evaluación de
ofertas

Organismo	Tipología	Proyecto	Descripción	Inv INI USD MM	Estado	Jun-18	Dic-18
MINT	Infreestructura	PPL_n°1	Centro Penitenciario	100	Operación	100	100
MTOP	Viales	C_0	Rutas 21-24 y Bypass a la Ciudad de Nueva Palm	75	Construcción	75	75
MTOP	Viales	C_1	Rutas 12, 54, 55 ,57 y Bypass a la Ciudad de Car	62	Cierre Financiero	62	62
MTOP	Viales	C_2	Ruta 9 (entre Rocha y Chuy) , Ruta 15 (entre Ro	55	Cierre Financiero	55	55
MTOP	Viales	C_3	Ruta 14 Oeste (desde Mercedes hasta Ruta 6), B	93	Cierre Financiero	93	93
MTOP	Viales	C_5	Rutas 14 (entre Ruta 6 y Ruta 15) y Ruta 15 (eni	127	Evaluación Ofertas (5 Of)		127
MTOP	Viales	C_6	Ruta 6 (desde Av. Belloni a intersección con Rut	76	Evaluación Ofertas (3 Of)		
MTOP	Viales	C_7	IP - Ruta 3 (Doble vía entre Rutas 1 y 11) y Bypa	72	Evaluación Ofertas (2 Of)		
ANEP/INAU	Infreestructura	E_1	Primer Proyecto - 44 Jardines de infantes y 15 C	48	Cierre Financiero	48	48
ANEP/INAU	Infreestructura	E_2	Segundo Proyecto - 23 Escuelas, 9 Polos Tecnol	79	Cierre Financiero	79	79
ANEP/INAU	Infreestructura	E_3	Tercer Proyecto - 27 Centros CAIF y 15 Escuelas	41	Evaluación Ofertas (3 Of)		
ANEP/INAU	Infreestructura	E_4	Cuarto Proyecto - 42liceos y 16 UTUs (ANEP)	129	Proceso licitatorio		129
MTOP	Ferroviaria	FC	FC- Puerto de Mvdeo - Estación PdT.	825	Evaluación Ofertas (3 Of)		825
MVOTMA	Vivienda		Viviendas	35	Estudios Previos		
ASSE	Hospitalaraia		Hospital Pasteur	-	Registro Iniciativa Pública		
Total Cartera PPP				1.817	Avance	512	1.593
						28%	88%

OPP

el futuro en
desarrollo


Avances del plan: ejecutado y PPP con procesos cumplidos

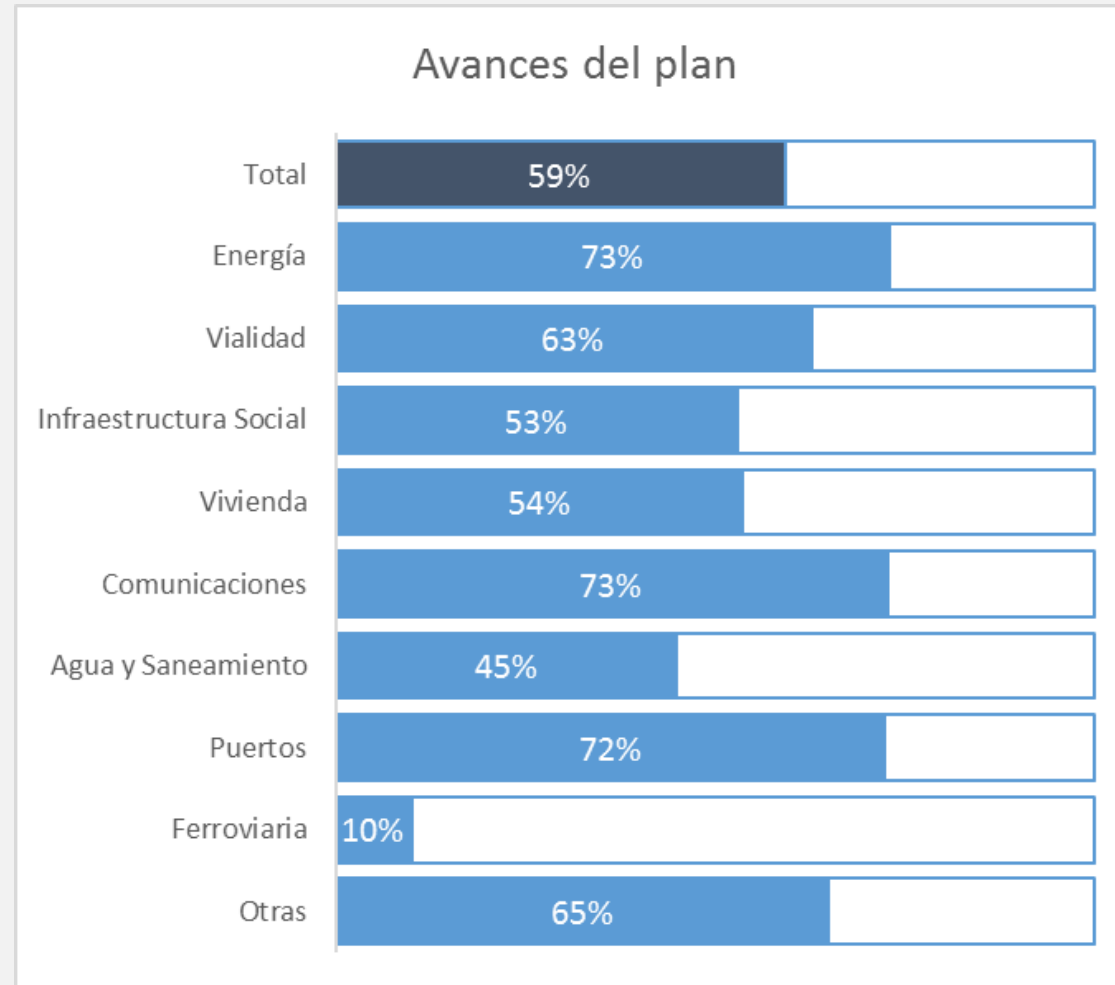

OPP


el futuro en
desarrollo

Apertura por forma de financiación

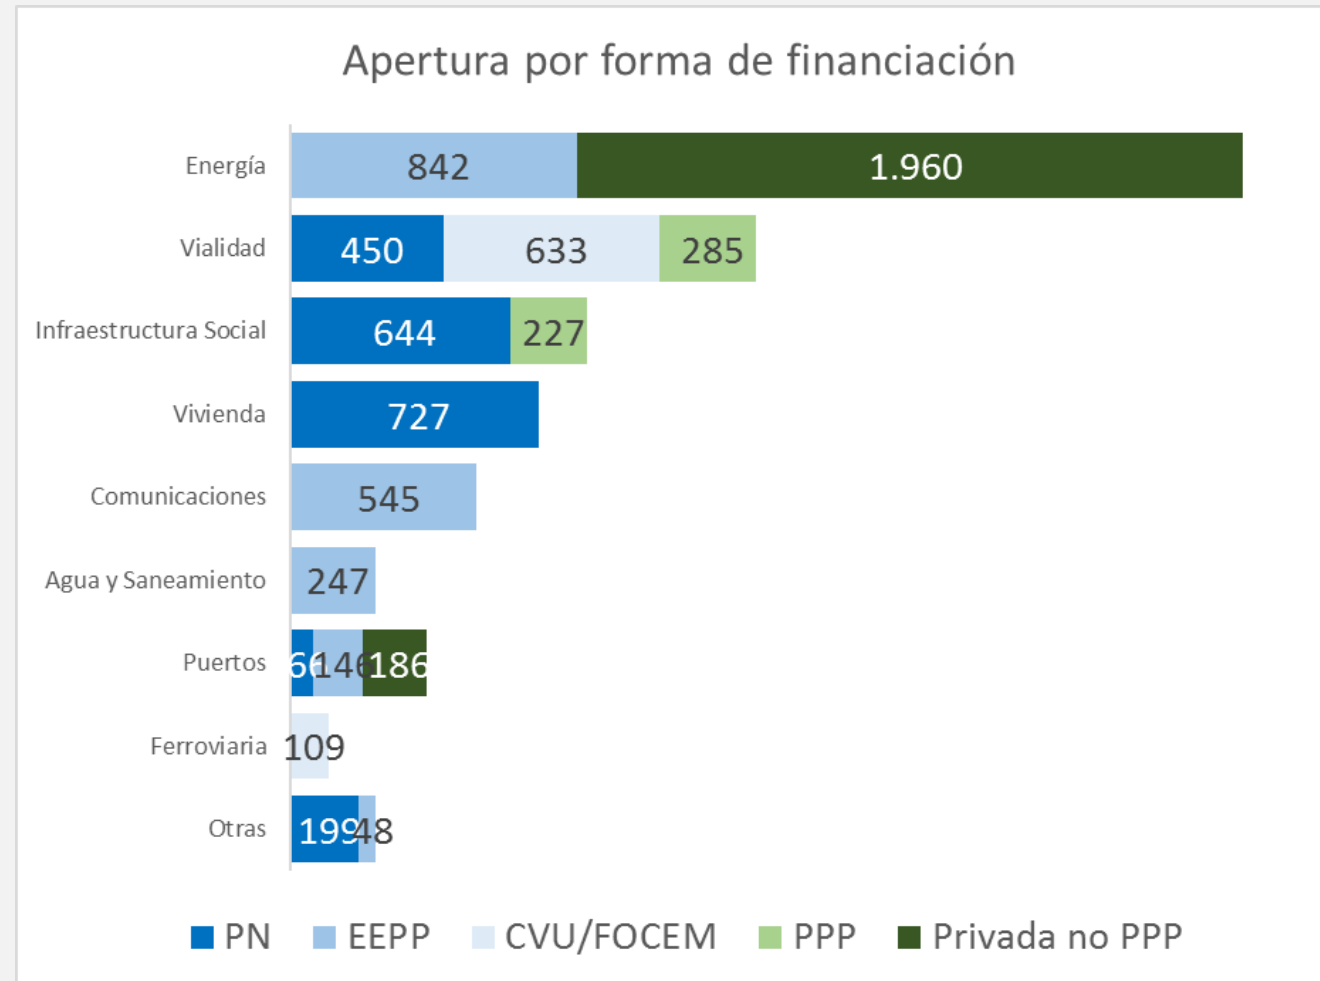

Apertura por forma de financiación

(perspectiva para diciembre de 2018)

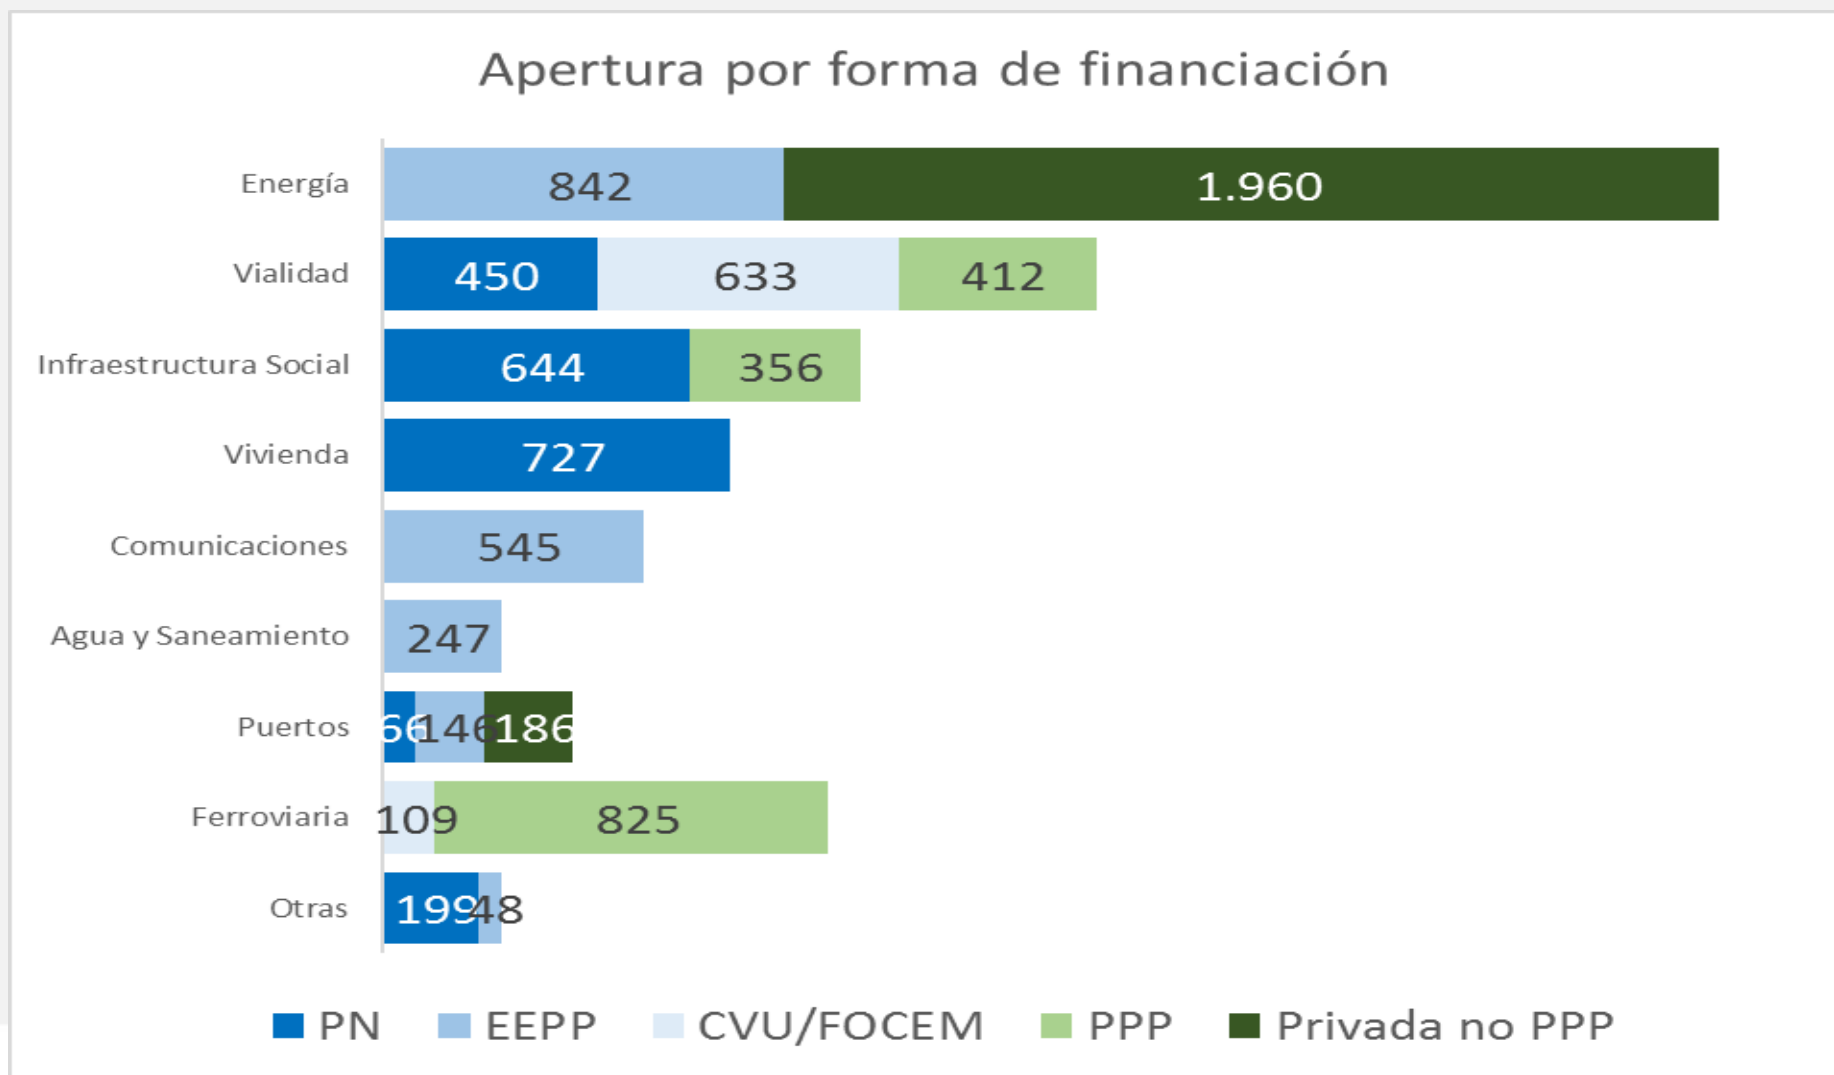

OPP

el futuro en desarrollo



OPP

el futuro en
desarrollo

Gracias
